ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | **Rel. No.:** FN1384-02

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP02 | **Início em:** 30/08/2012 | **Término em:** 30/08/2012

Cota: +0,17m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 30/08/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
2,00 metros 2 1/2		0,40	Areia fina e média, com detritos vegetais, cor escura			
	01		Silte pouco argiloso, pouco arenoso, médio, cor variegada	3	4	5
	02			3	3	4
	03			3	4	4
	04			5	4	5
	05	5,67		3	4	6
	06		Silte pouco argiloso, com veios de arenito, de médio a duro, cor variegada	7	7	9
	07	7,85		6	9	12
	08		Silte arenoso, com veios de arenito, muito compacto, cor variegada	17	25	
	09	9,79		14	22	
	10		Silte pouco argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada	8	12	17
	11			7	13	19
	12	12,51		10	14	20
	13		Silte arenoso, muito compacto, cor variegada	20/7		
	14	14,40		28		
	15		Silte pouco arenoso, pouco argiloso, de compacto a muito compacto, cor variegada	10	18	
			15,30 metros Limite da sondagem			
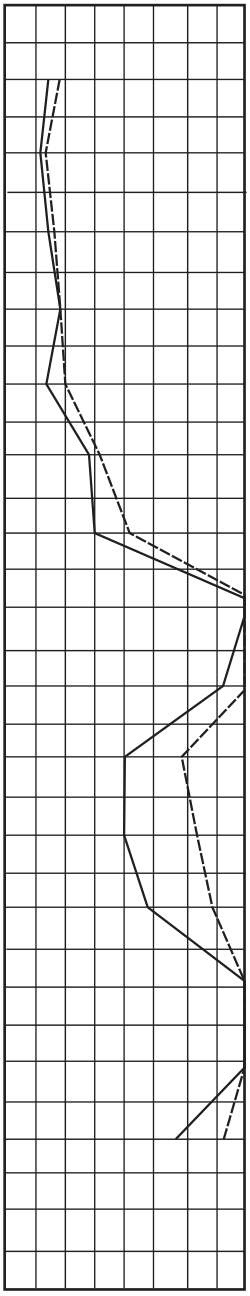
Número de golpes p/ os últimos 30cm
